

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Mirobaldo Lázaro; Albino Sexta Feira

Contactos (s)

874623038; 842264914

Data

2024-04-02

Nº da Lista

MUNGASSA_31

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/1602/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049903094581CR019907

Representante do AF

Antónia Rodrigues (Esperança Bernardo-filha)

ContactoAF

846818678

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Manga Mascarenhas Muave Mungassa
- Ndunda

BairroMungassa

Coordenadas

-19.755157 34.8787599 3.963 1.342

latitude (x.y °)

-19.755157

longitude (x.y °)


34.8787599

altitude (m)

3.963

accuracy (m)

1.342

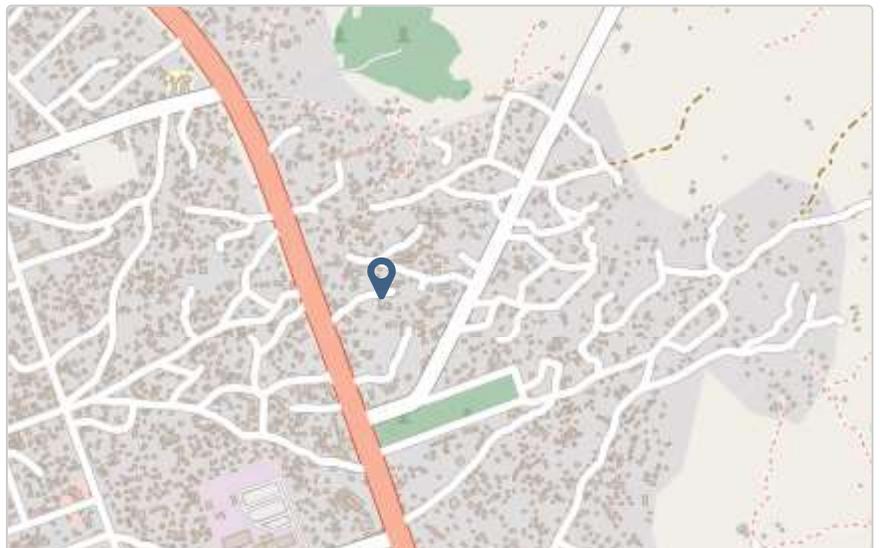

Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1712051459688.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1712051472700.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1712051482303.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1712051496420.jpg



Lote - Foto do acesso

1712051548637.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1712051537529.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1712051510999.jpg



Plot - Vista geral 2

1712051557557.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registro de dados não previstos verificados no terreno

1712051579079.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registro de dados não previstos verificados no terreno

1712051867243.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)

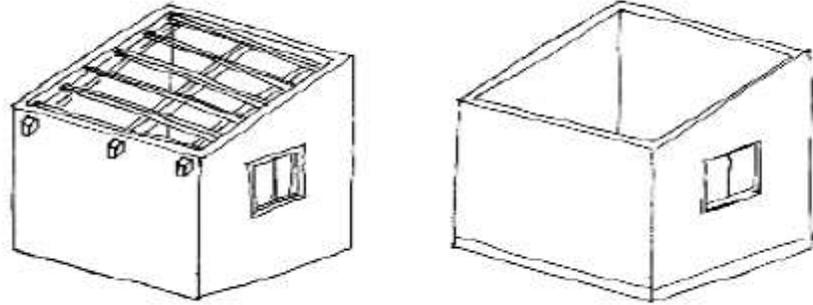


- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)

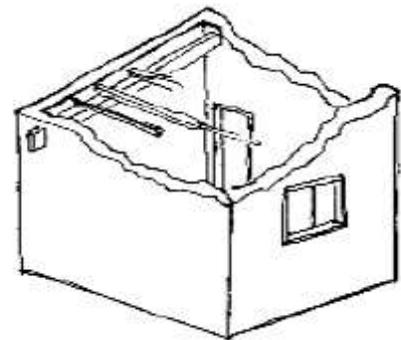

- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS

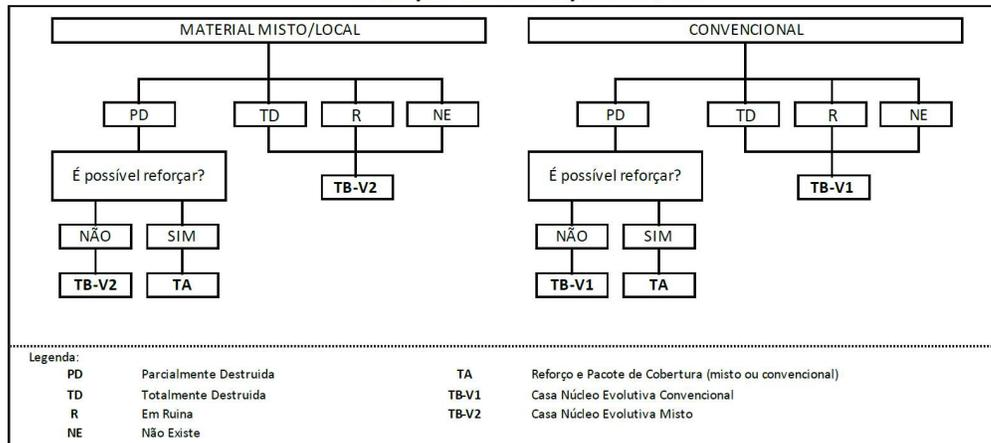

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Até a conclusão das obras

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

0min

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


Sim

Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

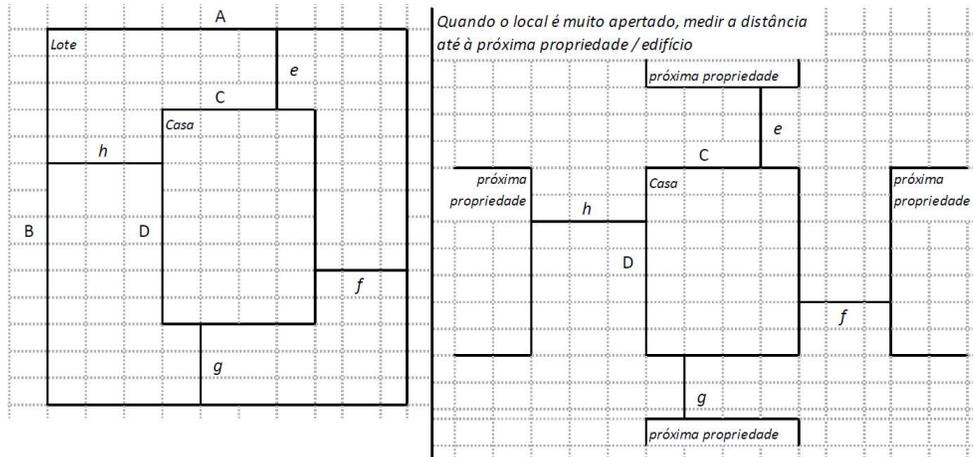

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(20,08x30,69)m

Dimensões da Casa (C x D)

(3,05x7,75)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

13,80m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

17,74m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


3,23m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,20m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

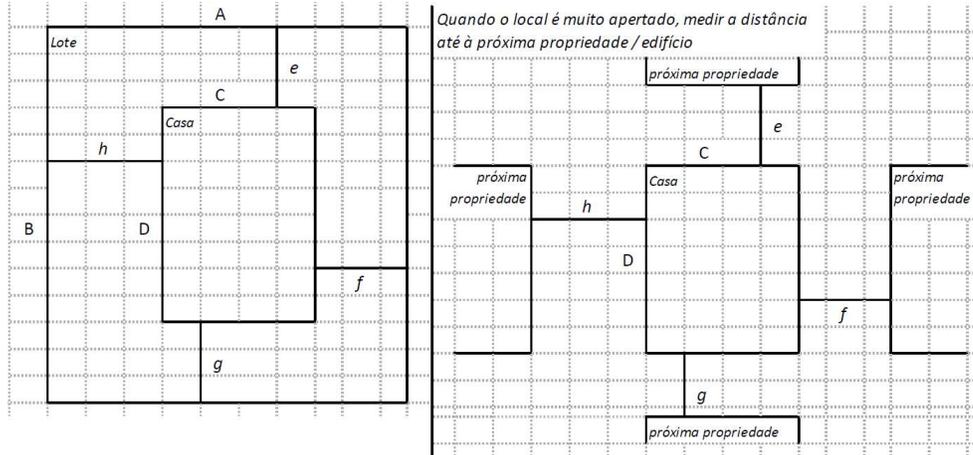

Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

(3,05x7,75)m

Dimensão do lote (A x B)

(20,08x30,69)m

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A cobertura e sua estrutura estão danificadas e existe muita infiltração de água em tempos chuvosos. No momento de levantamento estavam a reforçar a cobertura com lona plástica.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1712051829568.jpg

1712051829568.jpg

