

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nelio Duarte e Eliana Jeque

Contactos (s)

865002010 842787963

Data

2024-01-31

Nº da Lista

Chipangara _305

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

Obra/14063/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019902035970JH201099

Representante do AF

Teresa chinheiro

ContactoAF

877054430

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Chaimite | <input checked="" type="radio"/> Chipangara | <input type="radio"/> Esturro |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti | <input type="radio"/> Matacuane |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input type="radio"/> Ponta-Gea | |

Bairro

2° Bairro

Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706696795022.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706696809488.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706696829660.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1706696852853.jpg



Lote - Foto do acesso

1706696865327.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1706696891573.jpg



Plot - Vista geral 2

1706696903995.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

- Urbano
- Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros20 m

Minutos a andar40s

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?


- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

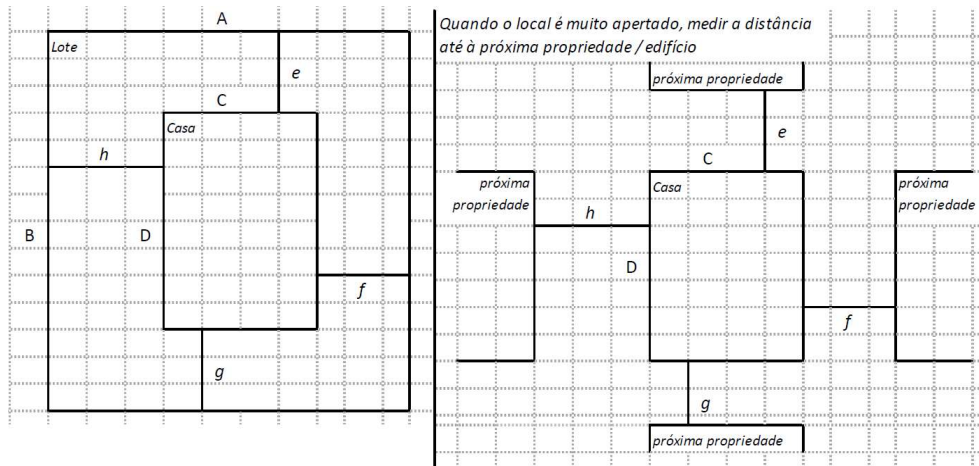

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

19.5mx22.3m

Dimensões da Casa (C x D)

12.4mx8.7

Distância da Casa ao limite do Lote: e

5m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

5.30m

Distância da Casa ao limite do Lote: g

8.60m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5.50

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não


De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

Coordenadas:Latitude:-19.8408Longitude:34.8627A casa em que a beneficiaria encontra-se está dividida em dois tipos de materiais misto e convencional, onde estas encontram-se coladas apenas separadas por paredes, sendo que a casa onde a mesma reside é convencional e a outra porta que esta arrendada é de Pau a pique. Onde se pode encontrar outras portas em aluguer por frente da casa também juntas a casa separadas apenas por paredes cujo o seu material é convencional.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)
