

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Sabino Basílio

Contactos (s)

843740135

Data

2023-06-28

Nº da Lista

2744

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

12011/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

12011

Representante do AF

Pange Muparengue

ContactoAF

00

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Buzi

Posto Administrativo

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

Localidade

- Bíndua
- Inhamichindo
- Grudja
- Nharongue
- Guaraguara

Bairro

Pavu-Chissamba

Coordenadas

-19.9716897 34.435174 11.3 4.58

latitude (x.y °)

-19,9716897

longitude (x.y °)


34,435174

altitude (m)

11,3

accuracy (m)

4,58

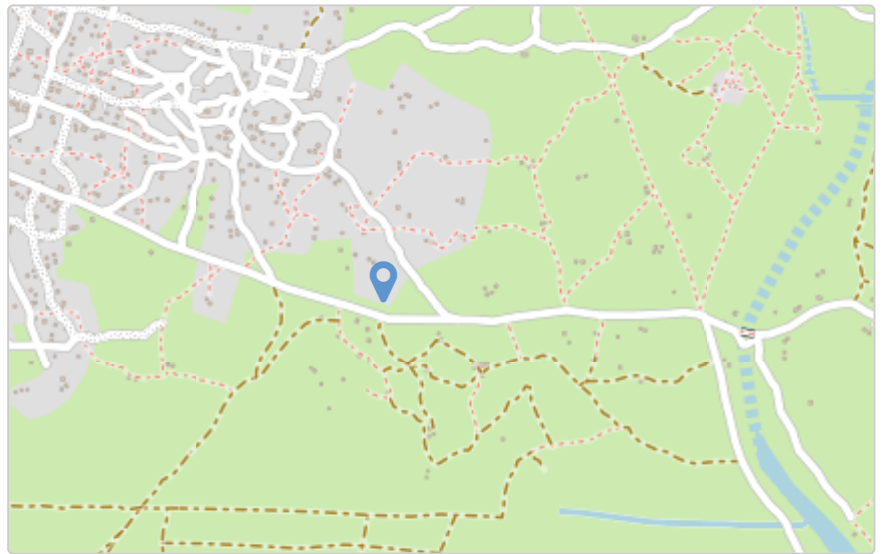

Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1687948777355.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1687948789363.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1687948800917.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1687948817122.jpg



Lote - Foto do acesso

1687948851949.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1687948863217.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1687948879566.jpg

**Plot - Vista geral 1**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Plot - Vista geral 2**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)

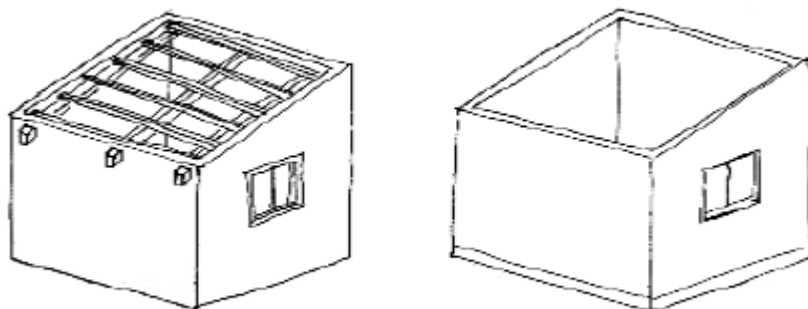

- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)

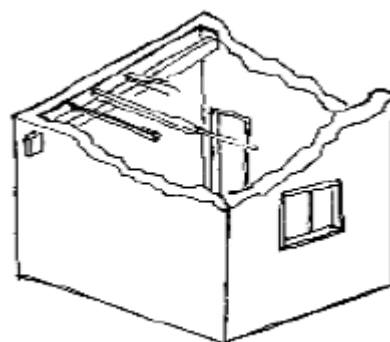

- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

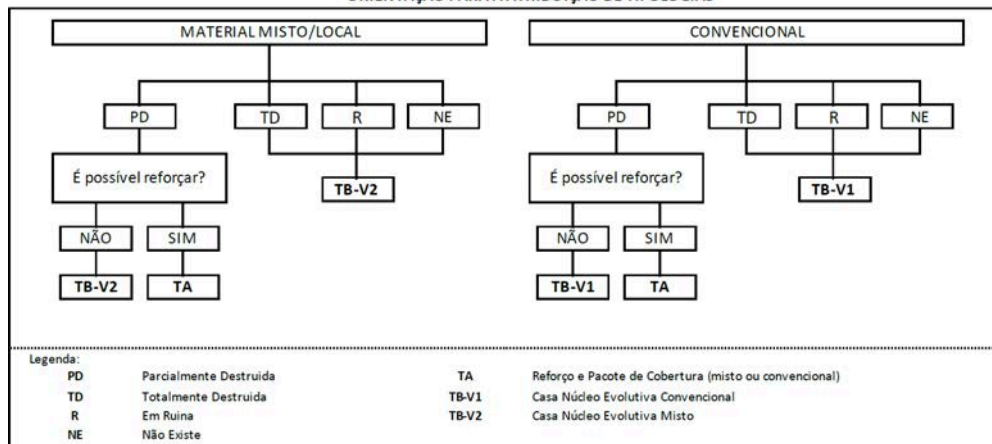Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

00

Minutos a andar

00

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

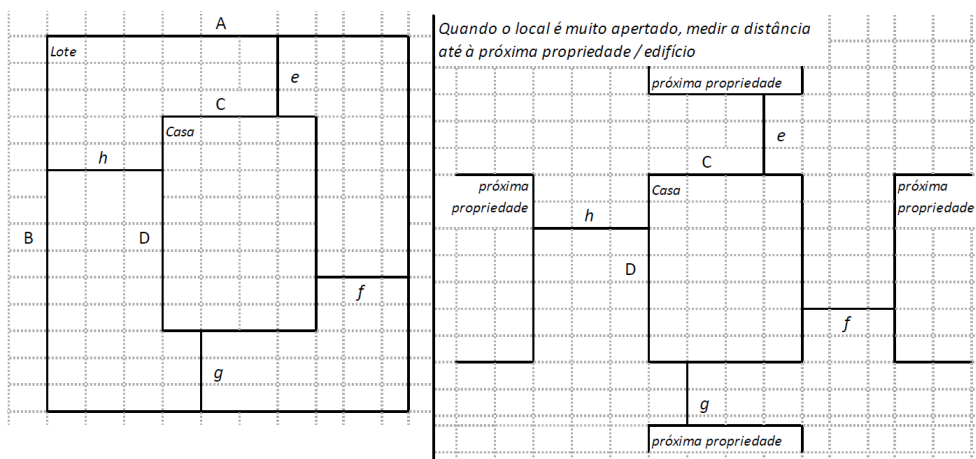

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

40x35

Dimensões da Casa (C x D)

72

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2

Distância da Casa ao limite do Lote: f

6

Distância da Casa ao limite do Lote: g


37

Distância da Casa ao limite do Lote: h

15

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

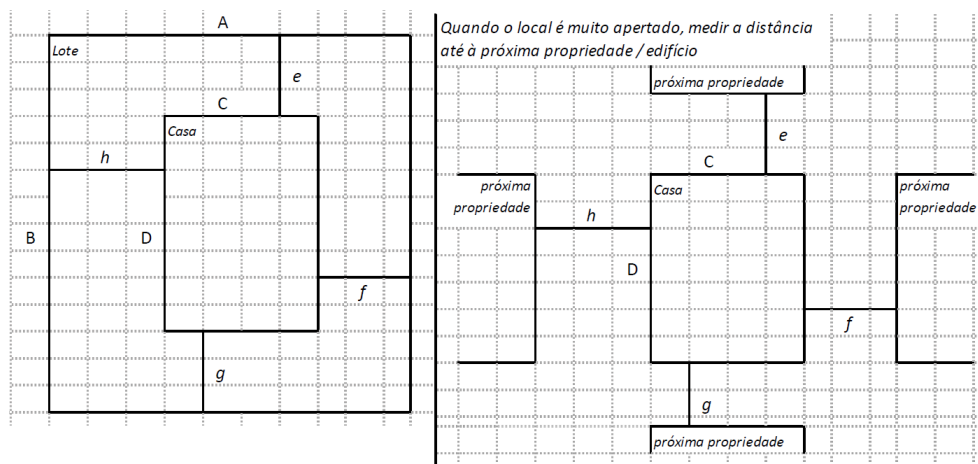

Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Sketches

1687949242670.jpg



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

Click here to upload file. (< 100MB)
