

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Astorga/Mandrassé

Contactos (s)

878519107/842731663

Data

2024-02-13

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_65

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/3607/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902115122JZ056679

Representante do AF

Domingas Macário

ContactoAF

840148633

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**

Alto da manga

Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.7760039

longitude (x.y °)

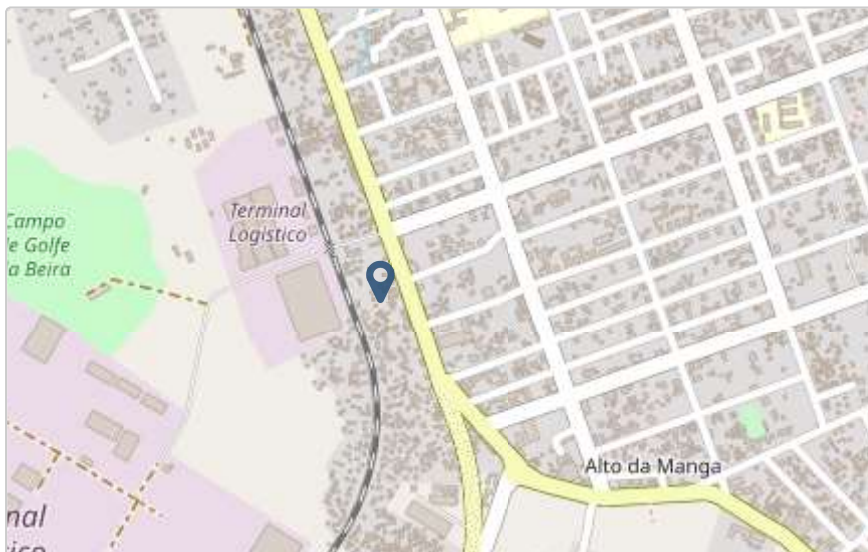
34.8678751

altitude (m)

9.300000190734863

accuracy (m)

1.47



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707821020431.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707821056744.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707821093098.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Lote - Foto do acesso

1707821102648.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1707821142271.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1707821134800.jpg



Plot - Vista geral 2

1707821118777.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

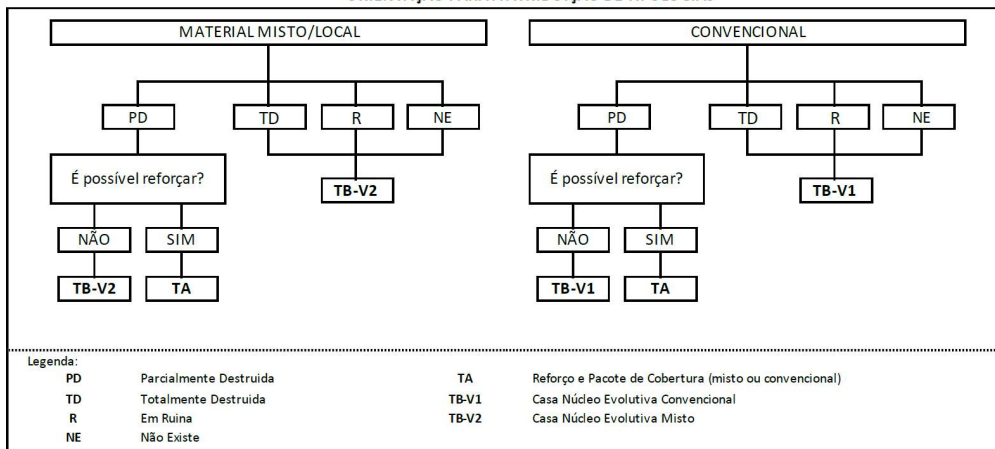
Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Durante a fase de construção

Planeamento e gestão da construção**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

10

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

10x15

Dimensões da Casa (C x D)

7,3x6,7

Distância da Casa ao limite do Lote: e

1

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,7

Distância da Casa ao limite do Lote: g

7,3

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

6,7x7,3

Dimensão do lote (A x B)

10x15

Outra informação relevante

Sem acesso a vista lateral esquerda

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**


- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

Não haverá nenhuma demolição, apenas remoção da cobertura.

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1707821576006.jpg

