

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Novas Gordinho, Alima Omar

Contactos (s)

877587897, 862096868

Data

2024-03-27

Nº da Lista

MUNGASSA_115

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/8993/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049903074561DS138193

Representante do AF

Luisa Tomo

ContactoAF

Não possui celular

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Manga Mascarenhas

Muave

Mungassa

Ndunda

Bairro

Mungassa

Coordenadas

-19.7472025 34.8753721 21.373 3.9

latitude (x.y °)

-19.7472025

longitude (x.y °)


34.8753721

altitude (m)

21.373

accuracy (m)

3,9

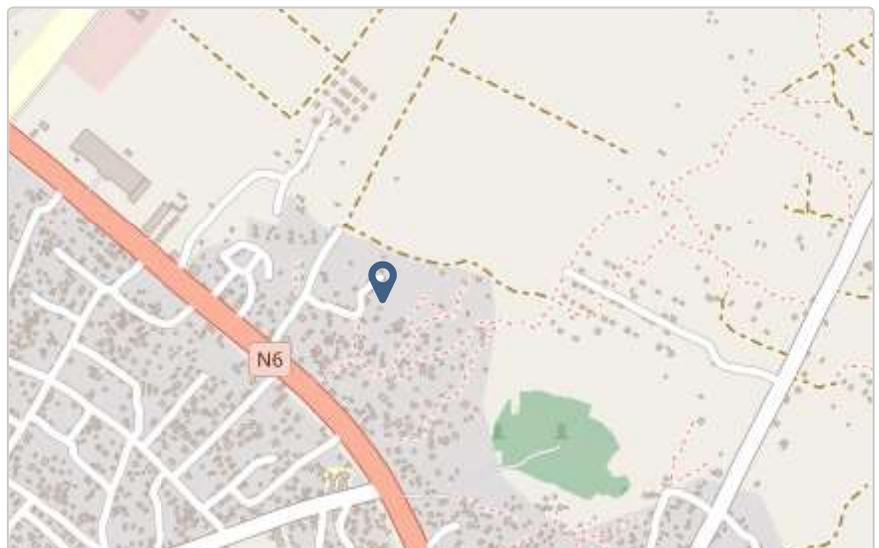

Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1711538719241.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1711538730595.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1711538747696.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1711538769756.jpg



Lote - Foto do acesso

1711538801668.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1711538827921.jpg



Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1711538844001.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
 Rural

Material


- Convencional
 Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)

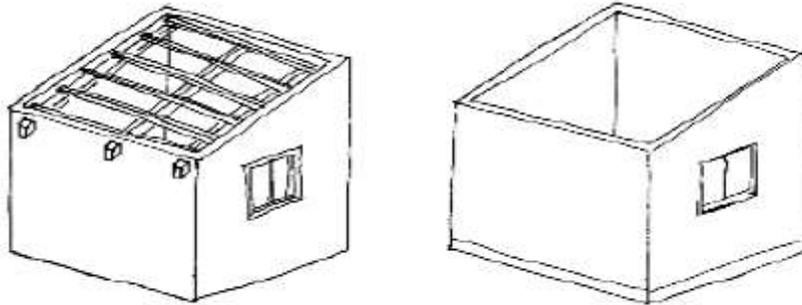

- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)

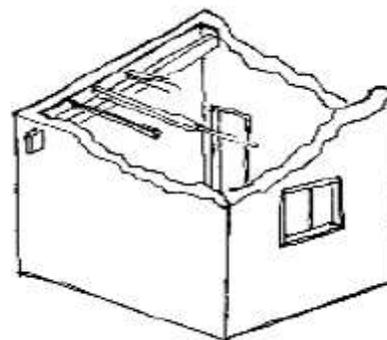

- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS

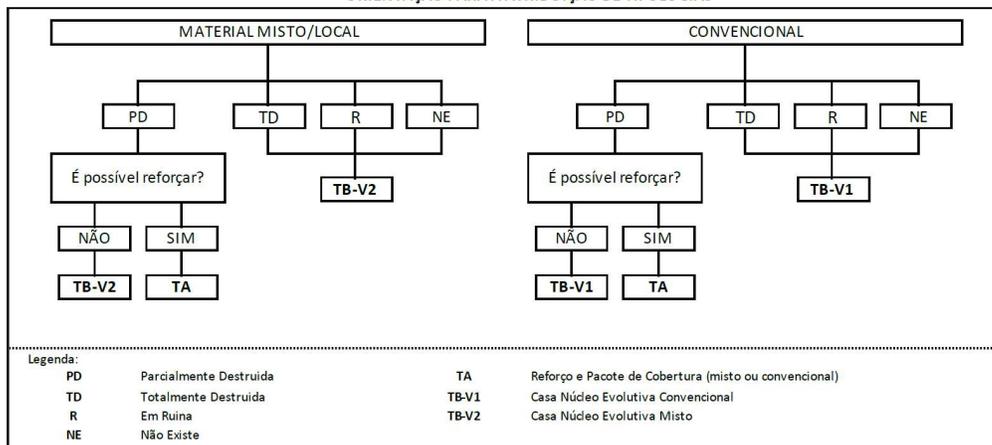

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Durante o processo de reconstrução

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

180 metros

Minutos a andar

15 minutos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não

» Local

O local é propenso a inundações?

Sim

Não

O local está inclinado?

Sim

Não

O local está congestionado?

Sim

Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Sim

Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?


Sim

Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

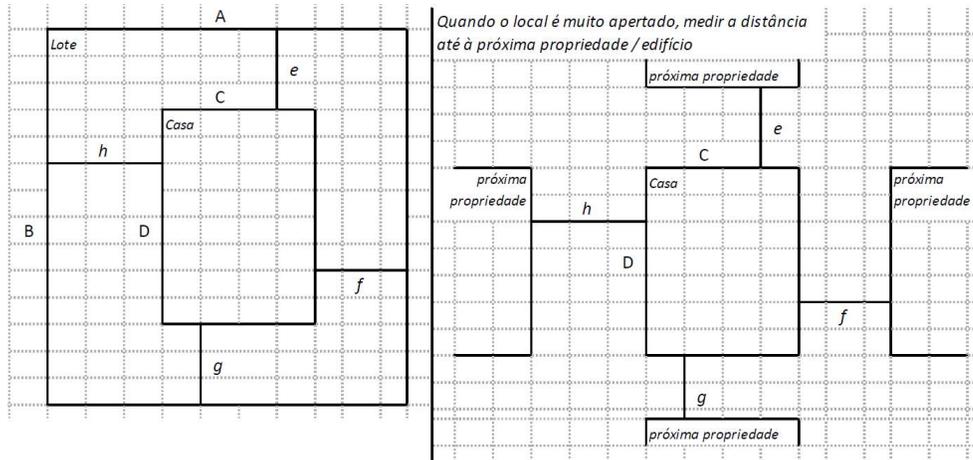

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

15x15 m

Dimensões da Casa (C x D)

9,60x3,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

3,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

3,00 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

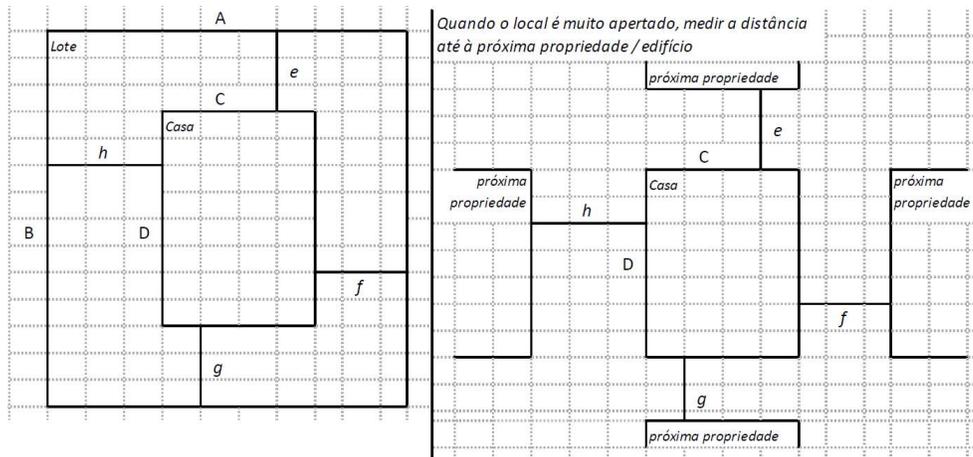

Nº de quartos

2 Quartos e 1 Sala

Dimensão de cada quarto (A x B)

3x3 m

Dimensão da casa (A x B)

9,60x3,00 m

Dimensão do lote (A x B)

15x15 m

Outra informação relevante

A casa não tem pilares

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa da Beneficiaria é feita de Material convencional, cobertura de chapas de zinco, sem pilares, apenas viga geral, assim sendo propomos a atribuição do pacote de cobertura convencional.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1711605549631.jpg

1711605549631.jpg

