

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Silvino Armando; Rosa Manuel

Contactos (s)

848616849; 846633007

Data

2024-04-18

Nº da Lista

CHOTA_141

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/13483/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029902083906EE193645

Representante do AF

Miguel Alfredo (Filho)

ContactoAF

846054977 (Chefe de AF)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

Bairro

Chota

Coordenadas

-19.8262164 34.8786617 -2.629 3.9

latitude (x.y °)

-19.8262164

longitude (x.y °)


34.8786617

altitude (m)

-2.629

accuracy (m)

3.9

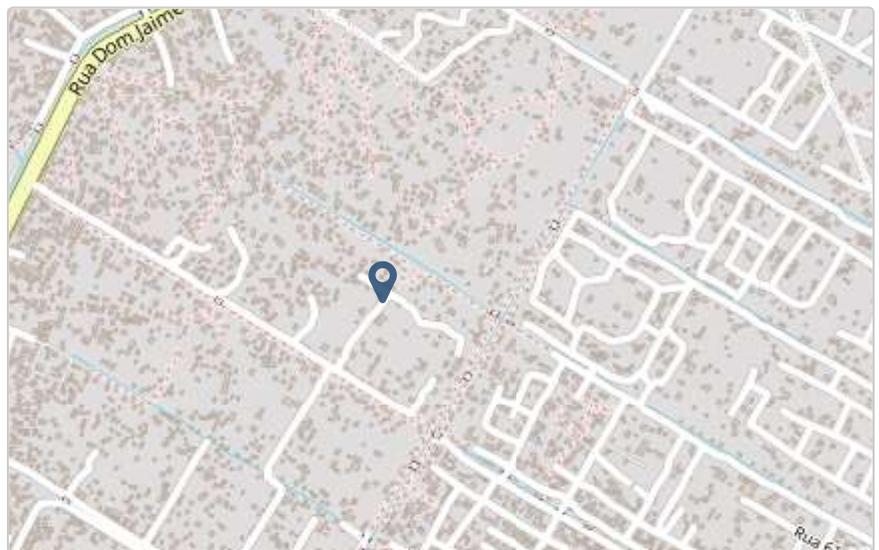

Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1713444557986.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1713444493592.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Habitação - Foto da esquina 4

1713444449455.jpg



Lote - Foto do acesso

1713444637960.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1713444618275.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1713444739590.jpg



3

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1713444783744.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material

Convencional

Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
 Não

Asnas de madeira

- Sim
 Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada

 image

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

220m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

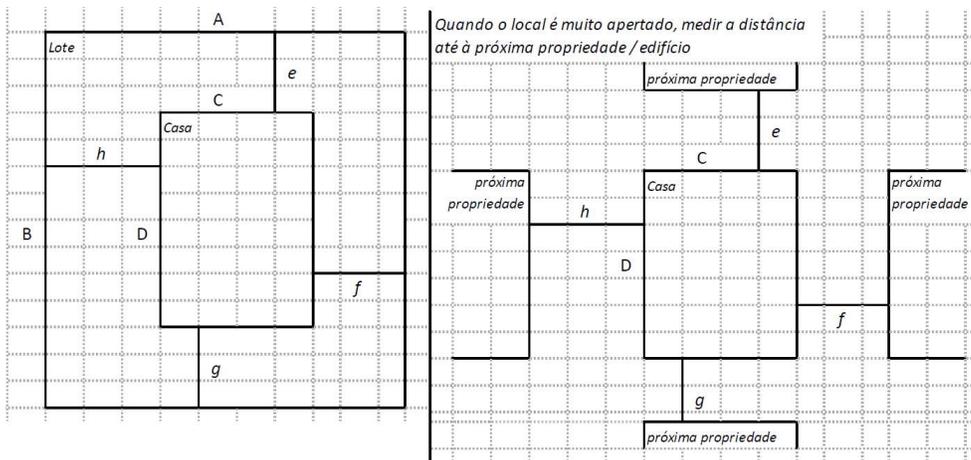

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

15,70x2045m

Dimensões da Casa (C x D)

7,50x4,30m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

8,20m

Distância da Casa ao limite do Lote: g

16,15m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0,00m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

. Casa de Alvenaria tipo 1. Chapas IBR. Com problemas de infiltração nas paredes e em alguns furos da chapa.. A AF disse que o quarto externo do filho foi derrubado pelo ciclone IDAI e construiu um de chapas.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1713445646619.jpg

1713445646619.jpg

